

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (UPE)

Atividade Avaliativa - Extensão

Grupo 2 - Hardening Windows

Sofia Queiroz, Mateus Cunha, Vinícius Ribeiro


Recife

2026

Relatório de atividades — Sprint 6

Transversal Sprint backlog:

Gráfico de Burn up do projeto. Foram 7 entregáveis totalizando 34 pontos, dos quais 2 tasks (10 pontos) foram entregues no início da semana relativa a finalização e ajustes da S5. Para o S6, 2 tasks foram entregues (8 pontos). Os demais entregáveis (16 pontos, 3 tasks) estão em progresso, pois dependem diretamente de testes, documentação e correção de itens que serão realizados com médicos piloto. Devido ao feriado e alguns problemas de merge nos diretórios do GitHub, tais atividades continuam válidas e serão passadas para a S7, conforme já alinhado com o PO. Importante salientar que o projeto encontra-se dentro das normalidades esperadas, visto que estamos em processo final de implementação.
O gráfico de burnup mostra o resultado estimado de cerca de 30 horas trabalhadas pelos Devs durante a sprint.

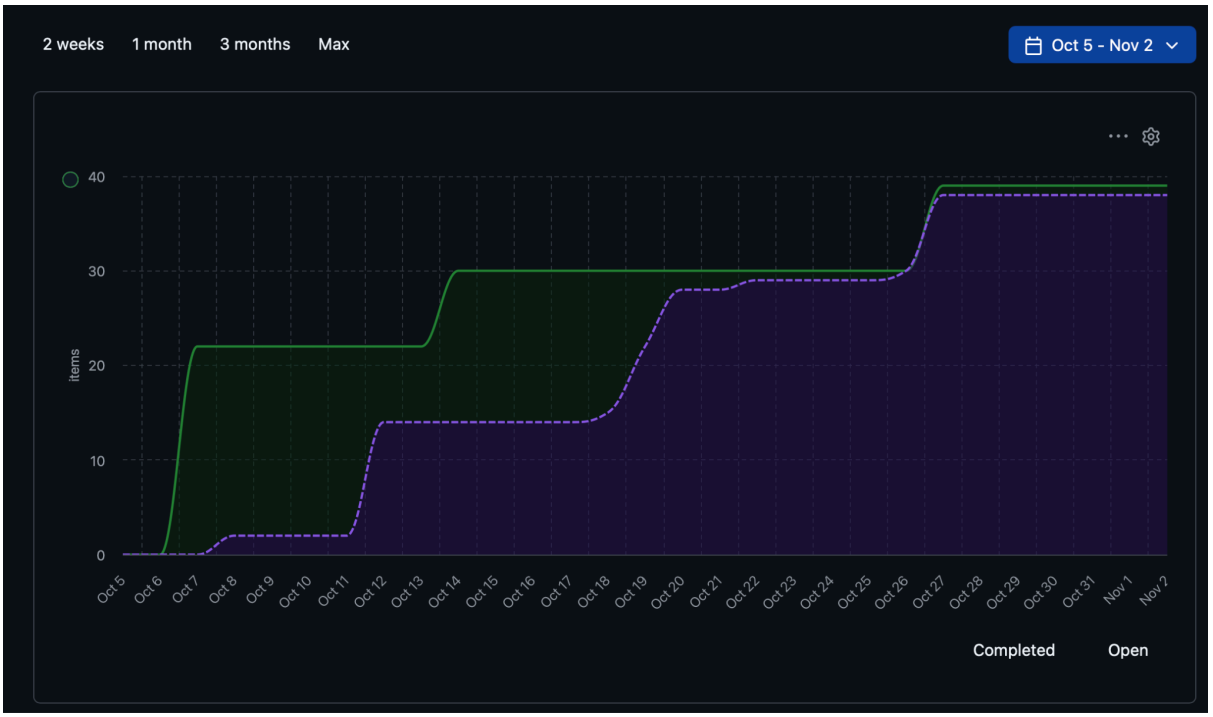

Backlog para o Sprint 6

	id	spi	epico	tipo	titulo	descricao	pon
Marco	B49	S5	PEP	feat	AmplimedAdapter escrita e formatSoapForPep	writeEvolution no campo de evolução; formato de texto por PEP	5
Alter	B54	S5	PEP	test	Fixtures HTML dos dois PEPs e testes Vitest	Fixtures + testes de cada adaptador com jsdom	5
Marco	B57	S6	Qualidade	test	run_eval.py completo	WER acerto de papel CID-10 alucinação de exame referências inventadas	5
Vinicius B	B58	S6	Piloto	chore	Piloto com médicos	Protocolo agenda consultas simuladas SUS entrevistas	5
Vinicius B	B59	S6	Piloto	docs	Relatório do piloto	Consolidar métricas SUS e achados; gerar itens de backlog	3
Riquelme	B60	S6	Privacidade	test	Teste de vazamento completo	Incluir áudio transcrito e PDF no teste de PII	3
Rafael & Vinicius José & Carlos & Gabriel	B61	S6	Piloto	fix	Correções de usabilidade do piloto	Itens prioritários apontados pelos médicos	8

Resumo DEV - Vinicius Barbosa

A conclusão dos entregáveis B58 e B59 depende de uma etapa de validação com médicos reais, que requer o apoio dos desenvolvedores e a participação de dois usuários selecionados. A coordenação para tais testes foi dificultada devido ao feriado, mas a demanda já foi passada

para o PO. Entretanto, como os médicos ainda não foram definidos, a validação permanece pendente e será concluída assim que os usuários estiverem disponíveis para que o time de desenvolvimento possa auxiliar na instalação das dependências (container) e instrução de usos com os usuários que testarão o software.

Resumo DEV - Vinicius Ribeiro

Resumo DEV - Alter Guedes

B54 / US019 — fixtures HTML dos dois PEPs (Amplimed e e-SUS PEC) e testes de cada adaptador com jsdom. Critério de aceite: testes no CI.

Fixtures (tests/fixtures/pep/)

- e-SUS PEC: esus-pec-soap-vazio, esus-pec-soap-preenchido e esus-pec-lista-atendimentos (outra tela do PEC, caso negativo).
- pagina-generica (formulário, textarea e editor contenteditable; não é PEP, caso negativo para os dois adaptadores). amplimed-consulta (B09) já existia.
- O HTML do e-SUS PEC já tinha uma fonte única, htmlPaginaPec (6 testes e o E2E a usam). As duas fixtures derivadas dela existem para serem abertas e lidas; fixtures.test.ts falha se divergirem (regenera com ATUALIZAR_FIXTURES=1). O README.md da pasta documenta a origem de cada arquivo.

Resumo DEV - Rafael Luna

Resumo DEV - Riquelme Lopes


Na B60 completamos o teste de vazamento de PII nos dois caminhos que o B47 tinha deixado de fora. Os 20 casos sintéticos, com nome, CPF, telefone, e-mail e endereço plantados, agora percorrem o fluxo de áudio de ponta a ponta: envio em partes, transcrição, e depois chat, sugestões e SOAP, exatamente como a extensão faz. Também percorrem o fluxo de PDF, com um PDF real gerado no teste e lido pelo leitor real, passando pelo upload e pelo SOAP. Em cada etapa, o teste confere que nada do que iria ao Gemini, incluindo o histórico do chat gravado no banco, contém PII, usando os mesmos critérios e lacunas conhecidas do B47; o log do servidor também é checado. Ao rodar, o teste encontrou um vazamento real: o `/api/chat` gravava no log a transcrição inteira da consulta, com os dados do paciente, e isso foi corrigido. Confirmamos que o teste realmente falha quando

uma proteção é removida, incluímos a B60 no passo bloqueante do CI e atualizamos a documentação de qualidade.

Resumo Front - Marco Aurélio

B57 - WER acerto de papel CID-10 alucinação de exame referências inventadas

- Medir o WER e identificação de papel nos 10 áudios de referência, acerto de capítulo/código CID-10, exames não mencionados e referências inventadas.
- Feito a adaptação da leitura dos 20 casos existentes e atualizado a documentação em `README da avaliação` e `documentação de qualidade`.
- Os testes passaram. Mas o `mock` usa os gabaritos; serve para testar o avaliador, não para medir a qualidade real da transcrição.

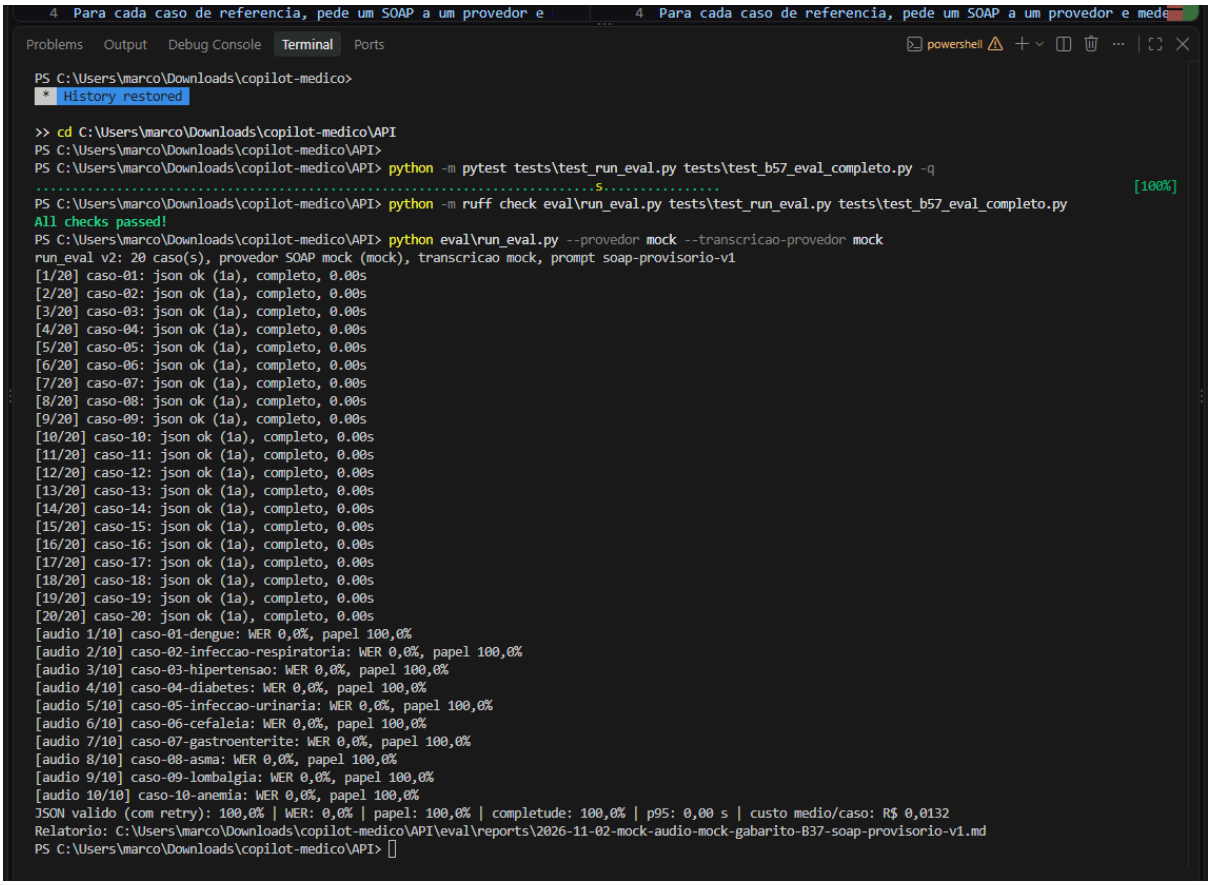

- O último comando avalia os 20 casos e os 10 áudios e gera relatórios em API\eval\reports. Para medir transcrição com Whisper/Groq.

“python eval\run_eval.py --provedor mock --transcricao-provedor whisper”

Resumo backend - Gabriel Henrique

Resumo Backend - Carlos Wilson

Backlog para a Sprint 7

B	C	D	E	F	G	I
id	**sp**	**epico**	**tipo**	**titulo**	**descricao**	**pon**
B62	S7	Release	fix	Bugs do piloto e cobertura mínima	Fechar bugs abertos; cobertura backend ≥ 60 %	8
B63	S7	Release	chore	Revisão de segurança	gitleaks pip-audit npm audit manifest health sem chaves	3
B64	S7	Release	docs	Docs atualizados e manual do médico	Requisitos arquitetura ADRs changelog manual de instalação e consentimento	5
B65	S7	Release	docs	Vídeo pitch e relatório técnico	Padrão REACT Labs; casos sintéticos; Amplimed e PEC	5
B66	S7	Release	chore	Release v5.0.0 e handoff	Tag release notes dist.zip README para a próxima equipe	2

Totalizando 23 pontos
